


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>5911 - 1</b>	Prøve nr <b>171018</b>
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt <b>Stabiltgrus kv. II</b>	Udtaget den <b>17-07-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>19-07-2017</b>
		Prøve start <b>20-07-2017</b>
		Prøve slut <b>21-07-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>5,0</b>		
<b>EN 933-5 Knusningsgrad</b>			
<b>Runde sten (g)</b>	<b>37</b>		<b>70</b>
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 3,434 U-tal : 39,3 (D60/D10)  
D100 3,42 D50 : 9,8

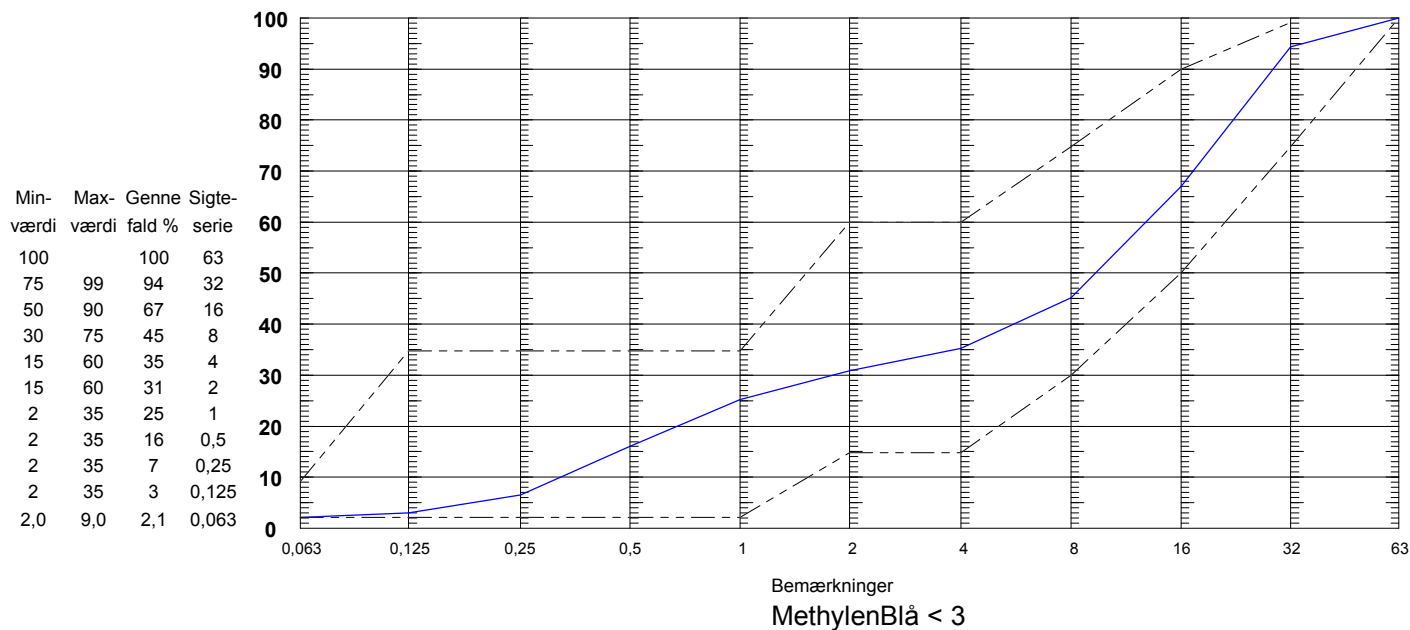

Lise Blessing
