


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>7103 - 1</b>	Prøve udtaget <b>kl. 8.15</b>	Prøve nr <b>161057</b>
Produktionssted Herrup Grusgrav Viborgvej 7830 Vinderup	Produkt <b>Bundsikring kv. II</b>	Udtaget af <b>Martin</b>	Udtaget den <b>22-08-2016</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Mærkning <b>NY Herrup</b>	Modtaget den <b>23-08-2016</b>
			Prøve start <b>23-08-2016</b>
			Prøve slut <b>24-08-2016</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>7,0</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>63</b>	<b>30</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,584 U-tal : 4,4 (D60/D10)  
D10 0,133 D50 : 0,5

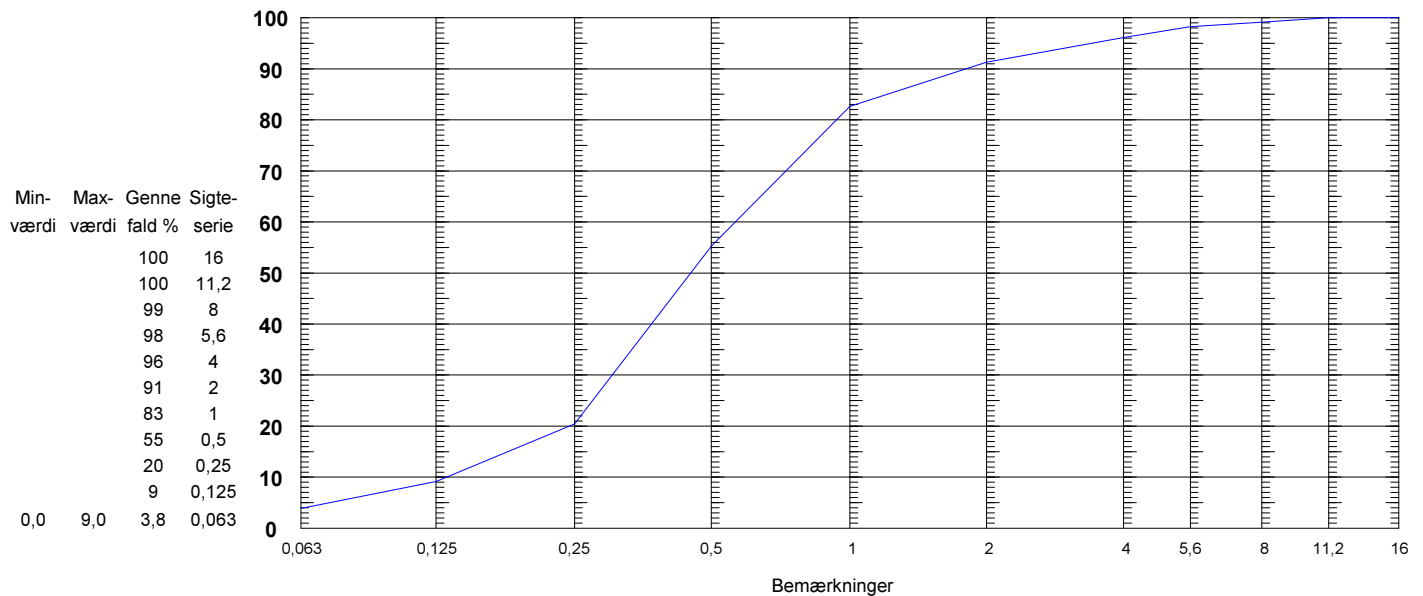

Lise Blessing
