


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Receptnr <b>5412 - 1</b>	Prøve nr <b>171308</b>
Produktionssted <b>Randers Grusgrav</b> <b>Vilstrupvej 3</b> <b>8900 Randers</b>	Produkt <b>Bundsikring kv.I</b>	Udtaget den <b>15-09-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>19-09-2017</b>
		Prøve start <b>19-09-2017</b>
		Prøve slut <b>20-09-2017</b>
	Udtaget af <b>KC</b>	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>6,3</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,493 U-tal : 3,2 (D60/D10)  
D100,156 D50 : 0,4

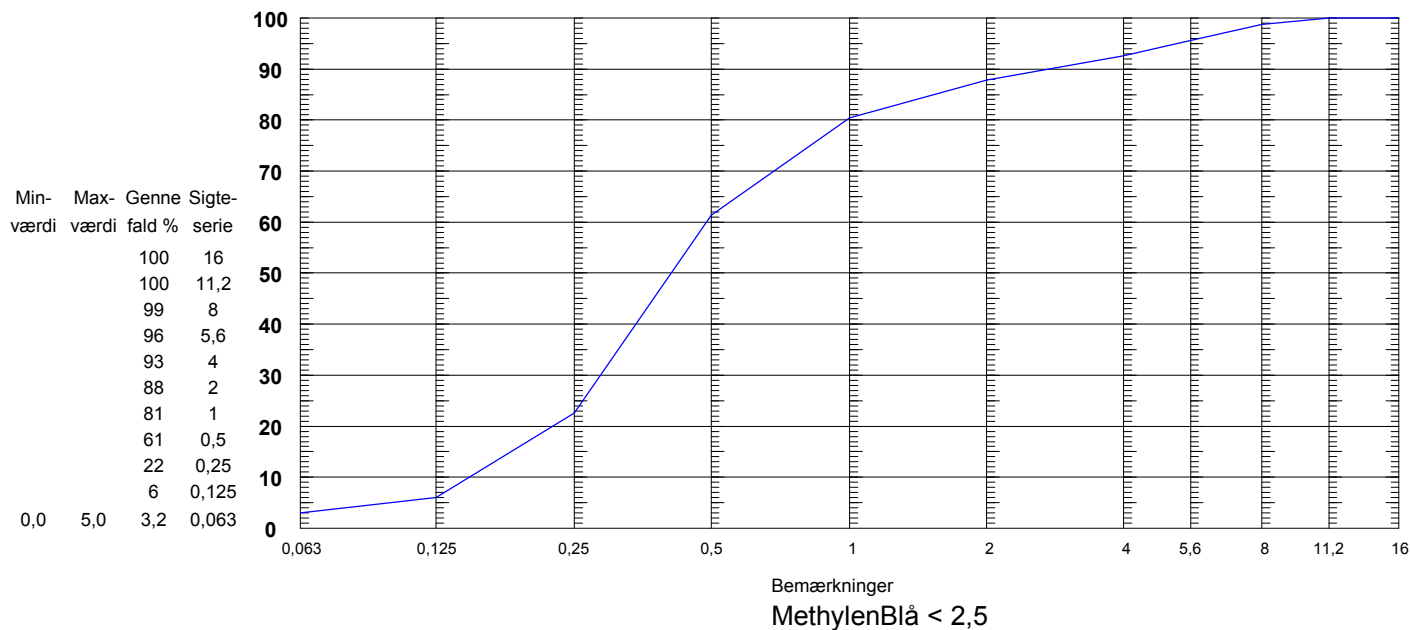

Charlotte Sørensen
