

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Øster Hedevej 2</b> <b>4000 Roskilde</b>	Varedeklaration <b>2703-1</b> Produkt <b>Bundsikring kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>23-09-2021</b> Modtaget den <b>27-09-2021</b> Reference nr	ID nr	Prøve start <b>27-09-2021</b> Prøve slut <b>28-09-2021</b>
Produktionssted <b>Andholm Grusgrav</b> <b>Bodumvej 1</b> <b>6230 Rødekro</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget  Udtaget af <b>Ola</b>		Mærkning <b>(Fyldsand)</b>

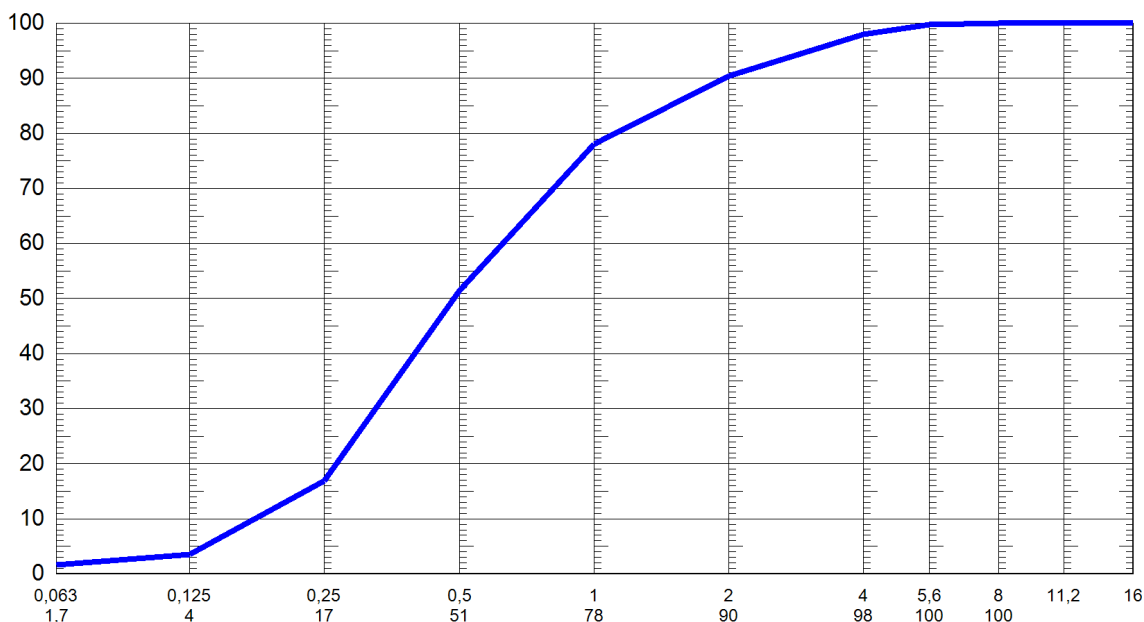
Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,6		

**Kornstørrelsesfordeling**

 D60 0,661 D50 0,490 D60/D10 (U-tal) 3,6  
 gnf.% D10 0,185

 Min- Max- Målt Sigte-  
 værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
100	5,6
98	4
90	2
78	1
51	0,5
17	0,25
4	0,125
0,0	9,0
1,7	0,063

 Sigte (mm)  
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

**Odense 28-09-2021**
**Lise Blessing, Laborant**
